



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
 Coordinación de Infraestructura

**PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO**  
**GRAFICA DE CURVA**

UNIDAD DE CAPACITACION EN  
 INFORMATICA  
 PLANTEL:  
 UBICACION:  
 TRABAJOS:  
 CIUDAD DE MEXICO  
 Mantenimiento de azotea en la Unidad de Capacitación en Informática y mantenimiento y limpieza de Inmueble para  
 INFORME N° **UNO**

**DATOS DEL CONTRATO**


<b>CONTRATISTA:</b>	South Oriental Enterprises, S.A. de C.V.
<b>NO. DE CONTRATO:</b>	DIA-008-2019
<b>MONTO CONTRATADO (SIN IVA):</b>	\$57,426.85
<b>MONTO DE CONVENIO (S/IVA):</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)</b>	\$57,426.85
<b>FECHA DE INICIO DE OBRA:</b>	05-ago-19
<b>TERMINACION REAL DE OBRA:</b>	19-ago-19
<b>MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO:</b>	\$0.00
<b>I.V.A.</b>	0.00
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO INCL IVA:</b>	\$0.00
<b>AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:</b>	\$56,576.85
<b>AVANCE FINANCIERO REAL:</b>	\$0.00
<b>AVANCE FISICO PROGRAMADO:</b>	100.00%
<b>AVANCE FISICO REAL:</b>	100.00%
<b>fecha de corte:</b>	18/08/2019

**OBSERVACIONES:**


**AVANCE DE OBRA**

QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO (FISICO)		REAL		ESTIM.	FECHA	MONTO
		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL			
0	05-ago	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1		
1	11-ago	16,351.60	28.47%	50,874.62	88.59%	1		
2	18-ago	56,576.85	98.52%	57,426.85	100.00%	2		
3	19-ago	57,426.85	100.00%			3		
4						4		
5						5		
6						6		
7						7		
8						8		
9						9		
10						10		
<b>TOTAL ESTIMADO:</b>								\$0.00
<b>MONTO EJECUTADO POR ESTIMAR:</b>								\$57,426.85
<b>AVANCE DEL FINQUITO</b>								0.00%
<b>FECHA DE TERMINACION FINQUITO</b>								

**GRAFICA DE COMPORTAMIENTO DE OBRA**

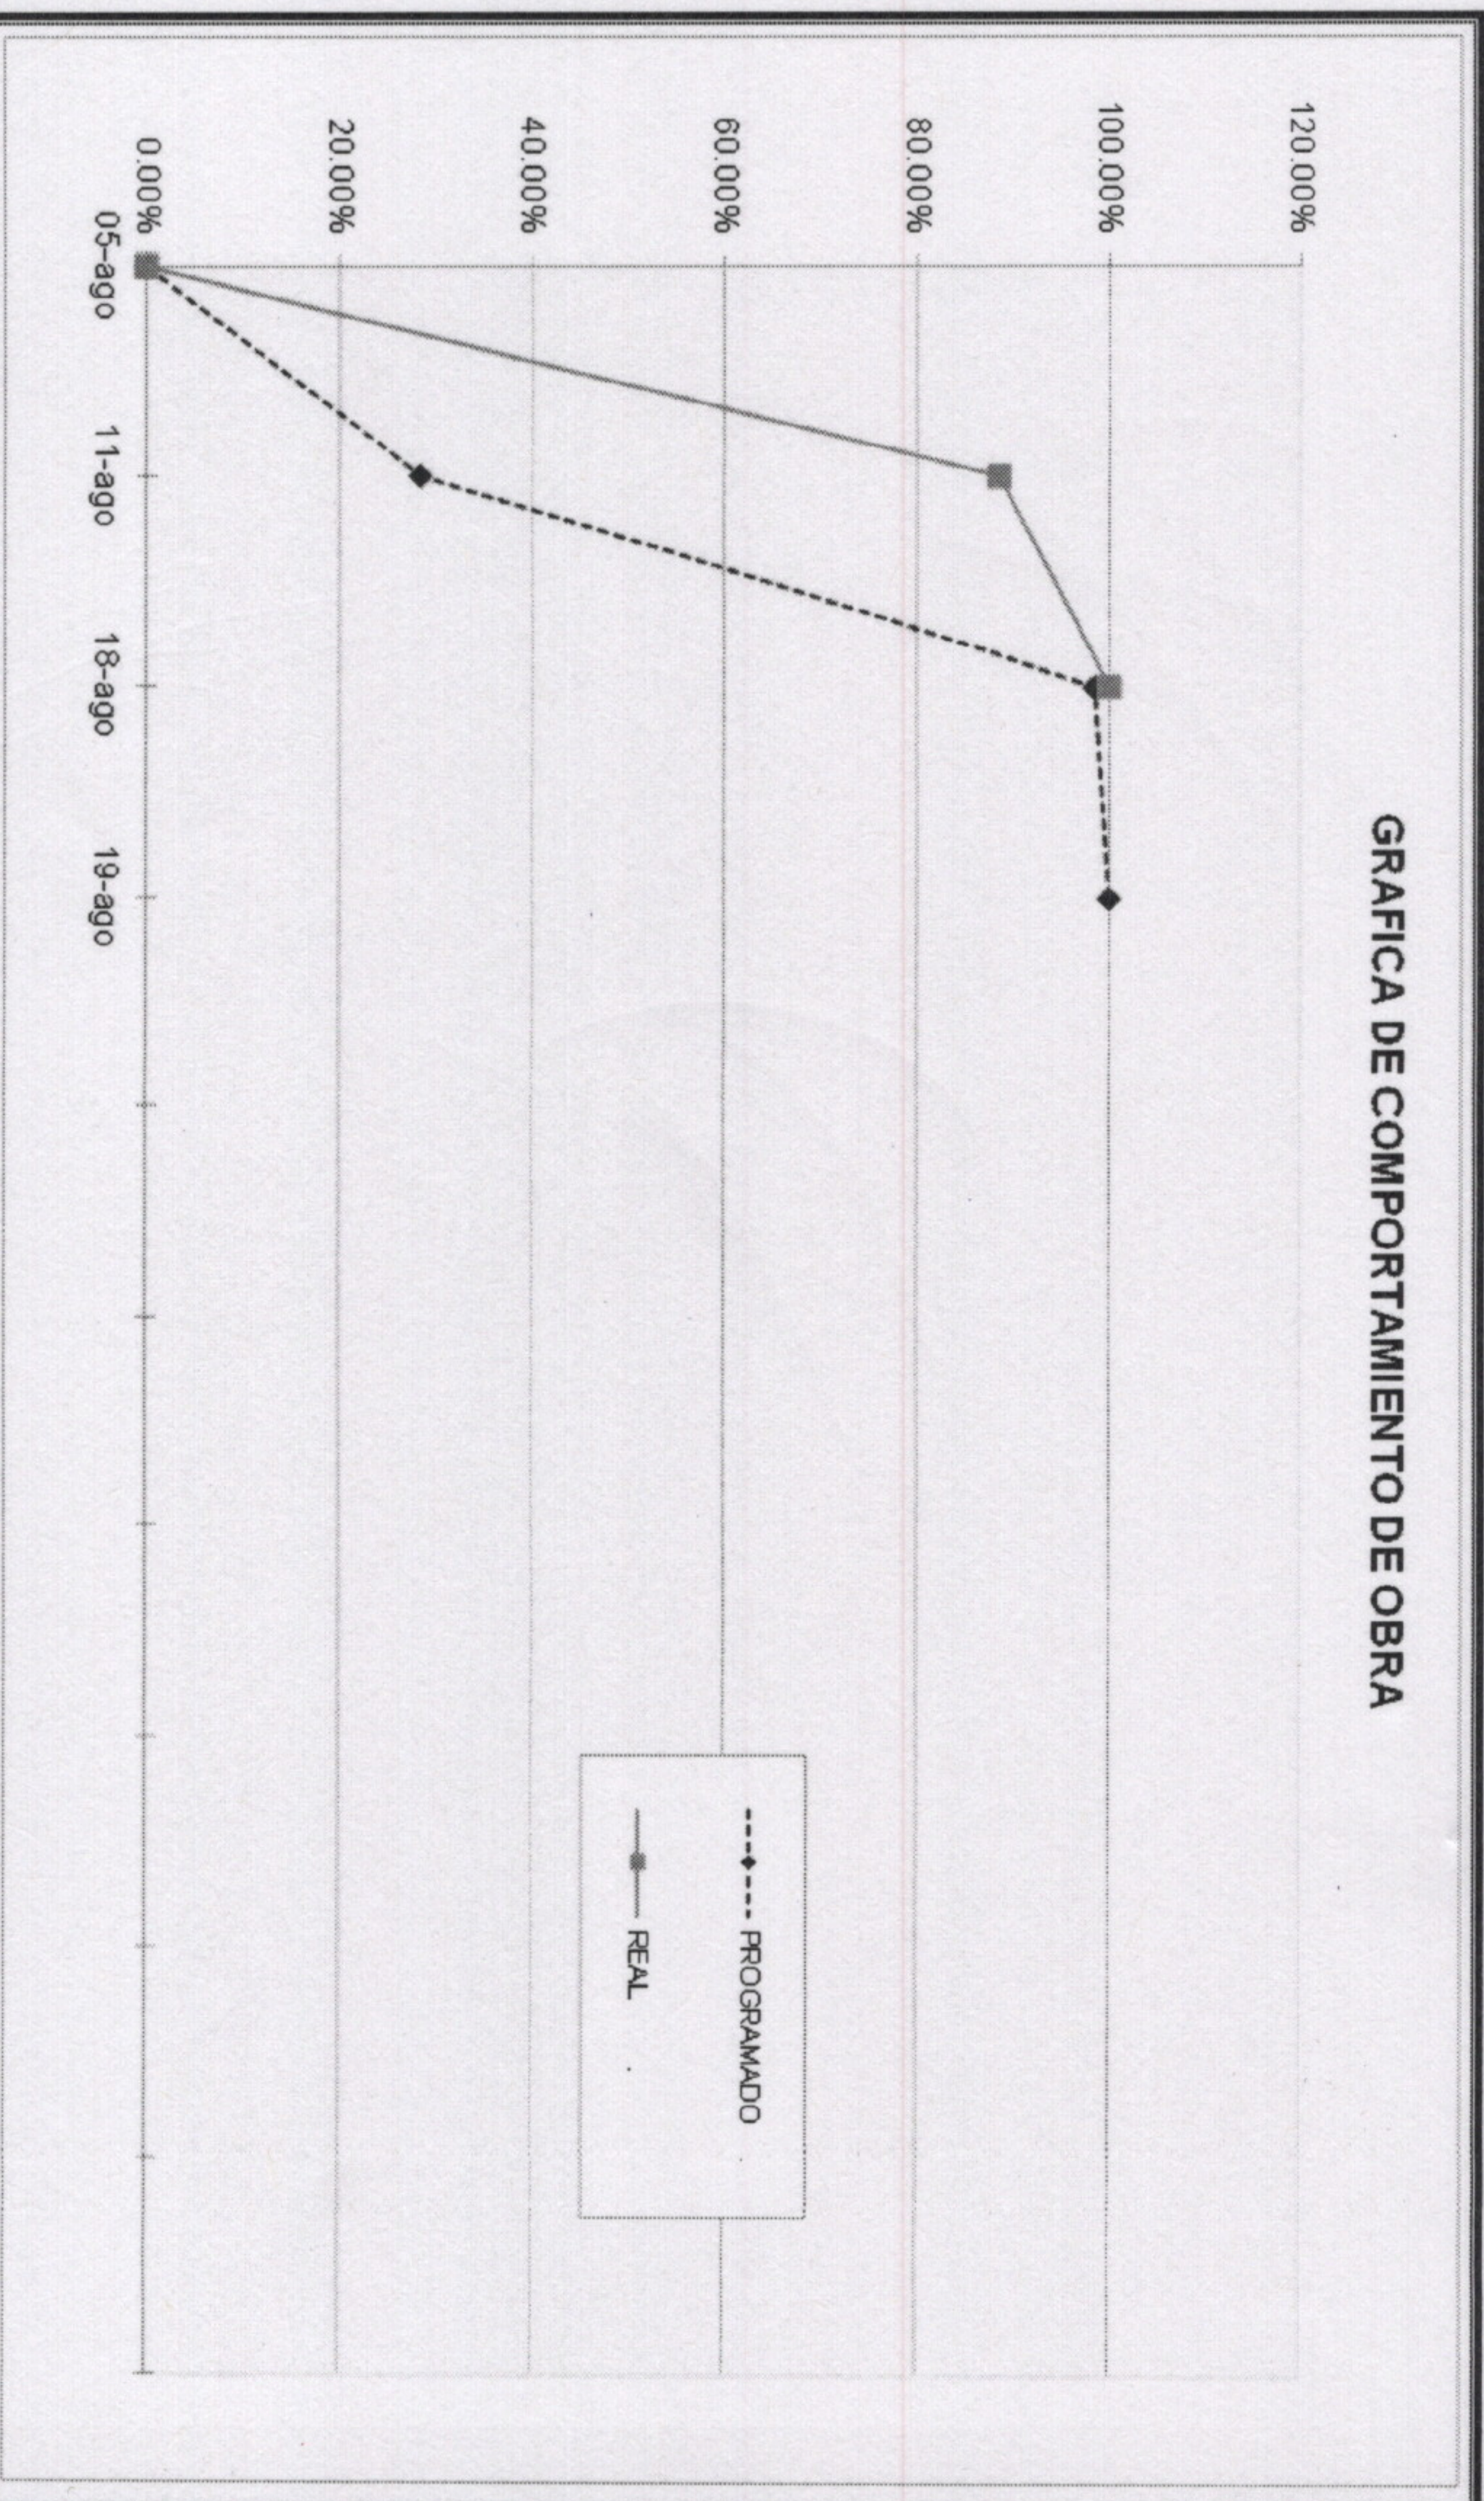

**SUPERVISION**

NOMBRE:  
**EUSEBIO JACINTO GONZALEZ**  
 RESIDENTE

FIRMA:

**CONTRATISTA**

NOMBRE:  
**DAVID ANTONIO JIMENEZ BRISEÑO**  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA:

*(Handwritten signatures in blue ink)*



