



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO
GRAFICA DE CURVA

PLANTEL:
 UBICACION:
 TRABAJOS:


ARAGON, VERGUSTAVO CARRANZA I, GUSTAVO A.
 MADERO I, TALPAH B, XOCOMILCO, COYOACÁN,
 ETACALCO Y TLOXIMAN
CIUDAD DE MEXICO
 MANTENIMIENTO A INMUEBLES E
 INSTALACIONES EN PLANTELES:

INFORME N° SIETE

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CAMACHO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-006-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$595,105.29
MONTO DE CONVENIO (SI/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (SI/IVA)	\$595,105.29
FECHA DE INICIO DE OBRA:	06-ago-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO:	\$0.00
I.V.A.	0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	\$0.00
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$595,105.29
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$337,621.72
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO REAL:	90.11%
fecha de corte:	31/10/2018

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCEVA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	06-ago	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1	02-oct-18	\$205,345.12
1	15-ago	103,525.79	17.40%	49,637.91	8.34%	2	19-oct-18	\$132,276.60
2	31-ago	322,412.69	54.18%	152,764.03	25.67%	3		
3	15-sep	451,193.41	75.82%	222,140.60	37.33%	4		
4	30-sep	573,602.77	96.39%	267,341.78	44.92%	5		
5	04-oct	595,105.29	100.00%	347,311.09	58.36%	6		
6	15-oct			467,693.31	78.59%	7		
7	31-oct			536,273.18	90.11%	8		
8						9		
9						10		
10								
						TOTAL ESTIMADO :		\$337,621.72
						MONTO EJECUTADO		\$536,273.18
						POR ESTIMAR :		\$198,651.46
						AVANCE DEL FINIQUITO		ANTICIPO (SI/VA) :
						FECHA DE TERMINACION FINIQUITO		

OBSERVACIONES:

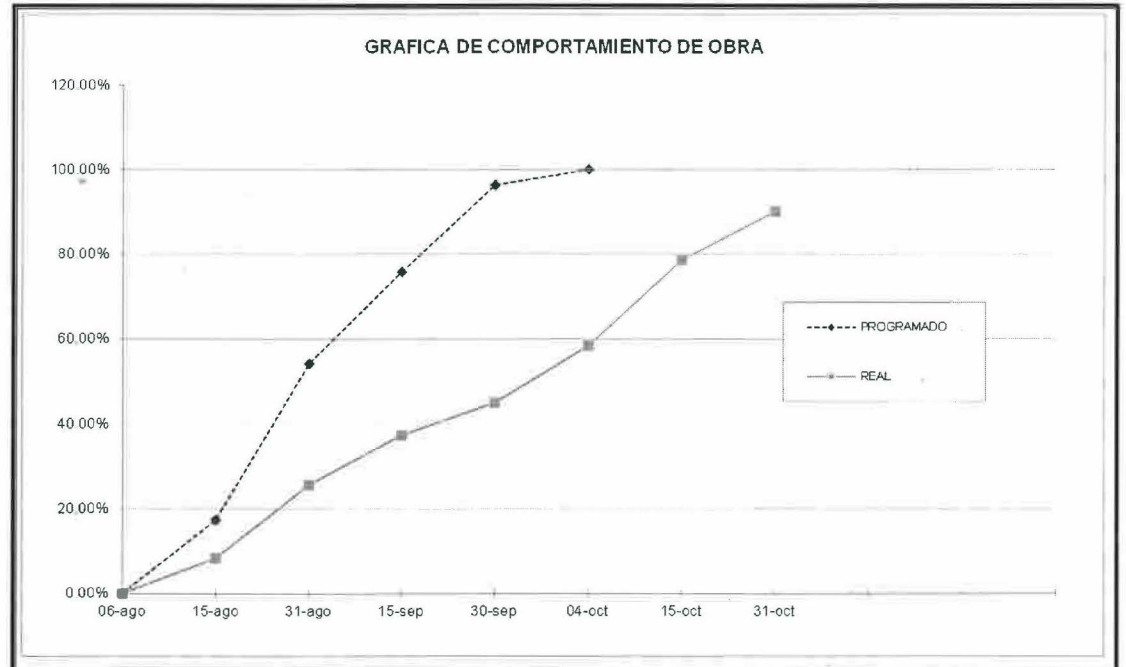

SUPERVISION
 NOMBRE: ARQ. EUSEBIO JACINTO GONZALEZ
 RESIDENTE
 FIRMA: _____

CONTRATISTA
 NOMBRE: ING. RUBÉN CAMACHO ZÚÑIGA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 FIRMA: _____
